Technischen Hochwasser- und Starkregenvorsorge

Stadt Sinzig

1. Halbjahr 2025

Andreas Polch

HOCHWASSER-/ STARKREGENSCHUTZMAßNAHMEN

- Planung, Prüfung, und Umsetzung der aufgestellten Maßnahmen
- Bearbeitung des Hochwasservorsorgekonzeptes
- Umsetzung Maßnahmen zur Gewässerunterhaltung Sinzig, Franken, Koisdorf, Westum, Löhndorf, Bad Bodendorf
- Teilnahme an verschiedenen Informationsveranstaltungen Hochwasserschutz / Hochwasservorsorge
- Abstimmungen sowie Begehungen SGD-Nord und untere Wasserbehörde Kreisverwaltung Ahrweiler

BEARBEITUNG DES HOCHWASSERVORSORGEKONZEPTES BEISPIEL WESTUM

Hochwasservorsorgemaßnahmen für den Ortsteil Westum

Nr.	Maßnahme / Maßnahmenart	Aufwand	Unabhängig / Abhängig	Umsetzung	Förderfähigkeit	Träger
W 1	Kuhbach I Renaturierung I Retentionsraum oberhalb Ortslage I Ausbau der Sohlbefestigungen I Rückhaltung Gewässerbezogen	2-3	unabhängig	kurzfristig, mittelfristig	Ev.Aktion Blau Plus Förderbereich 2.5	Stadt Sinzig
W 2	Seitenzulauf Kuhbach (von Gehhardshof) I Gewässer renaturieren I Sohlbefestigung ausbauen I Sohle anheben Gewässerbezogen	2-3	unabhängig	kurzfristig, mittelfristig	Ev. Aktion Blau Plus Förder- bereich 2.5	Stadt Sinzig
W 3	Kuhbach I Freihalten Gewässerrandstreifen Gewässerbezogen	2-3	unabhängig	kurzfristig, fortlaufend	Techn. Hochwasserschutz Förderbereich 2.8	Stadt Sinzig
Nr.	Maßnahme / Maßnahmenart	Aufwand	Unabhängig / Abhängig	Umsetzung	Förderfähigkeit	Träger
W 4	Kuhbach I Einbau von Grobrechen und Rechenanlage Sandfang am Durchlass „Am Zeiberberg“ Gewässerbezogen	2-3	unabhängig	kurzfristig	Techn. Hochwasserschutz Förderbereich 2.8	Stadt Sinzig
W 5	Asphaltweg Kuhbach I Bankette Schälen diffuse Ableitung in Son-nebach oberhalb Bebauung / Ortslage Flächenbezogen	1-2	unabhängig	kurzfristig, fortlaufend	Ev. Wasserrückhaltemaß-nahme Förderbereich 2.7	Stadt Sinzig
W 6	Hellenbach oberhalb Ortslage I Renaturierung I Retentionsraum schaffen I Extreme Tiefenerosion beseitigen I Gewässersohle anheben Gewässerbezogen	2-3	unabhängig	kurzfristig, mittelfristig	Ev. Aktion Blau Plus Förderbereich 2.5	Stadt Sinzig
W 7	Hellenbach oberhalb der Ortslage I Grobrechen einbauen Gewässerbezogen	2-3	unabhängig	kurzfristig	Techn. Hochwasserschutz Förderbereich 2.8	Stadt Sinzig
Nr.	Maßnahme / Maßnahmenart	Aufwand	Unabhängig / Abhängig	Umsetzung	Förderfähigkeit	Träger
W 8	Hellenbach oberhalb Ortslage I Freihalten Gewässerrandsreifen von Lager, Bebauung und Zaunanlagen Gewässerbezogen	2-3	unabhängig	kurzfristig	Techn. Hochwasserschutz Förderbereich 2.8	Stadt Sinzig

- Retentionsraum geschaffen
- Gewässer Rückhaltung
- Einbau von Grobrechen
- Bankette Schälen
- Diffuse Wasserableitungen beseitigen
- Tiefenerosion beseitigen
- Freihaltung Gewässerrandstreifen
- Außengebietswasser fernhalten
- Regelmäßige Kontrolle und Pflege Bestand
- Anwohnergespräche führen
- Gewässerstörende Lagerungen entfernen
- ……

KONTROLLPLAN

BACH- UND BERGEINLÄUFE & ABLAUFRINNEN

1X MONATLICH + EREIGNIS

1		Bach und Bergeinläufe (Flächenentwässerung) mit hoher Priorität bei Starkregen_ Kleefuß/Polch 14. Juni 2025			
2	Pos.	Sinzig	Kontrolle D	Reinigung notwendig JA/Nei	Datum Erledigt
3	S 1	Kleine Hohl "Sandfang" (2xJährl.)	16.06.2025	Gitter mit Laub und Gehölz belegt	gereinigt 18.06. MK
4	S 2	Harbachpark (REWE) Bachlauf	16.06.2025	i.O	
5	S 3	Harbachpark (REWE) Einlaufbauwerk	16.06.2025	i.O	
6	S 4	Harbach (alter Stadtgraben/Grabenstr	16.06.2025	i.O	
7	S 5	Rheinstr. Gully	16.06.2025	i.O	
8	S 6	Wadenberg Bergeinlauf	16.06.2025	i.O	
9	S 7	Talendweg Querschlag, Gully	16.06.2025	i.O	
10	S 8	Friedrich-Ebert Str. Bachlauf	16.06.2025	i.O	
11	S 9	Breslauerstr. Bachlauf	16.06.2025	i.O	
12	S 10	Mühlenbergweg Gully	16.06.2025	2x Töpfe am Ende voll	16.06.25 geleert MK
13	S 11	Am Hellenberg Bachlauf	16.06.2025	i.O	
14	S 12	Koisdorferstr. Gully			
15	S 13	Auf dem Schlagberg Rinne/Gully	16.06.2025	i.O	
16					
17		Sandkauler Weg 50 (Straßeneinlauf)	16.06.2025	i.O	
18		Grobrechen Haarbach Sinzig (Nr.87)	16.06.2025	i.O	
19		Am Dorn Auslauf zur Ahr	16.06.2025	i.O	
20		Westum			
21	W 1	Drosselweg Bacheinlauf	16.06.2025	i.O	
22	W 2	Drosselweg/Lerchenweg Rinne	16.06.2025	Rinne Frei / Einlaufgitter Reinigen	BH Beauftragt 16.06.
23	W 3	Oststr. Rinne/Gully	16.06.2025	i.O	
24	W 4	Westerwaldstr. Querrinne(n)	16.06.2025	Rinne Frei / Einlaufgitter Reinigen	BH Beauftragt 16.06.
25	W 5	In der Galters (Ende) Querrinne	16.06.2025	Rinne Frei / Einlaufgitter Reinigen	BH Beauftragt 16.06.
26	W 6	In der Anbrück Bachlauf	16.06.2025	i.O	
27	W 7	Falkenweg Teilstrecke	16.06.2025	i.O	
28	W 8	Angerstr. Bergeinlauf/Gully	16.06.2025	i.O	
29	W 9	Hubertusstr. Bergeinlauf	16.06.2025	i.O	
30	W 10	Wachtelweg Bergeinlauf	16.06.2025	i.O	
31	W 11	Sternstraße (Ende) Querrinne			
32		Krechelheimerstr. (Bauwerk + Grobrec	16.06.2025	i.O	
33		Grobrechen Drosselweg	16.06.2025	i.O	
34		Bad Bodendorf			
35	B 1	Sebastianusstr. ACO-Rinne/Gully	16.06.2025	i.O	
36	B 2	Schützenstr. Gully	16.06.2025	3 Töpef Voll ab Peterstal	geleert 17.06.25 MK
37	B 3	Heerweg Bergeinlauf			
38	B 4	Burggrafenstr. Querrinne	17.06.2025	i.O	
39	B 5	Einläufe Ahrbrücke			
40		Einlauf Burggrafenstr. Richtung Sinzi	17.06.2025	i.O	
41					
42		Löhndorf			
43	L 1	Orsbeckstr. Bachlauf	16.06.2025	i.O	
44	L 2	Am Landgraben Querrinne	16.06.2025	Rinne / Einlaufgitter Reinigen	BH Beauftragt 16.06.
45	L 3	Vehnerstr. Bacheinlauf	16.06.2025	i.O	
46	L 4	Heimersheimerstr. ACO-Rinne			
47	L 5	Auf der Albach Querrinne	16.06.2025	Rinnengitter Reinigen	BH Beauftragt 16.06.
48	L 6	Bergeinlauf Ecke K 44			
49	L 7	Regenrückhaltebecken r. Westum	16.06.2025	Zuweg verschlammt	S.Braun Informiert
50	L 8	Prümerstr. Gullys Neubaugebiet	16.06.2025	i.O	
51	L 9	Am Landgraben (Fa.Fuchs) Einlauf	16.06.2025	i.O	
52					
53		Grobrechen Löhndorf			
54		Koisdorf			
55	K 1	Siebengebirgsstr. Querrinne(n)	17.06.2025	i.O	
56	K 2	Kapellenweg (Ende) Einläufe	17.06.2025	i.O	
57	K 3	Ahrentalerstr. Bergeinlauf/Gully	17.06.2025	2x Töpfe voll	geleert 17.06.25 MK
58	K 4	Flurstr Bachlauf	17.06.2025	i.O	
59	K 5	Connesdorferstr. Gully	17.06.2025	i.O	
60	K 6	Hunsrückstr. Gully/Bachlauf	17.06.2025	i.O	
61	K 7	Parkplatz Siebengeb. Koisdorferstr.			
62		Eifelstraße Ecke Marienstraße Einläuf	17.06.2025	Einlauf voll	geleert 17.06.25 MK
63					
64					
65		Franken			
66	F 1	Breisigerstr. Rinne	17.06.2025	i.O	
67	F 2	An Kapelle Grabeneinläufe	17.06.2025	i.O	
68	F 3	Frankenbach	17.06.2025	i.O	
69	F 4	Donsweg Grabeneinläufe	17.06.2025	i.O	
70	F 5	Frankenstr.68A / Obergasse Einlauf	17.06.2025	i.O	
71		Grobrechen Franken	17.06.2025	i.O	
72					

DURCHGEFÜHRTE MAßNAHMEN

KONTROLLFAHRTEN NACH EREIGNISSEN & VERANLASSEN VON MAßNAHMEN

DURCHGEFÜHRTE MAßNAHMEN

KONTROLLFAHRTEN NACH EREIGNISSEN & VERANLASSEN VON MAßNAHMEN

DURCHGEFÜHRTE MAßNAHMEN

DURCHFÜHRUNG & VERANLASSEN VON REINIGUNGSMAßNAHMEN

DURCHGEFÜHRTE MAßNAHMEN

AUFFÜLLEN VON FREISPÜLUNGEN;

DURCHGEFÜHRTE MAßNAHMEN

BÄUME AUS AHR & GEWÄSSERN ENTFERNEN (VERKLAUSUNGEN)

DURCHGEFÜHRTE MAßNAHMEN

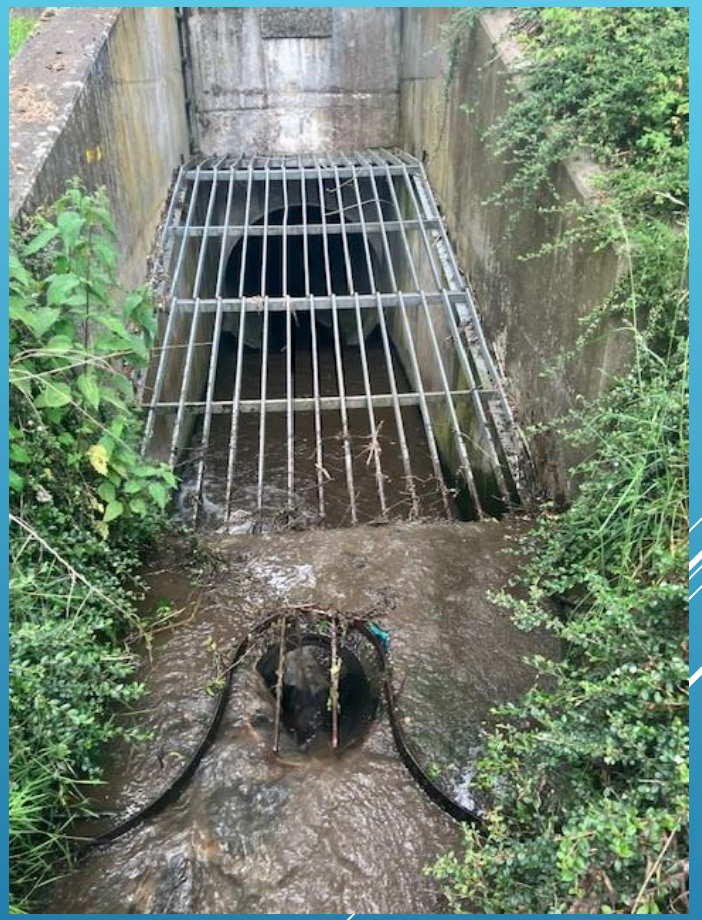

VERANLASSEN VON MAßNAHMEN – REINIGEN ALLER EINLAUFGITTER

DURCHGEFÜHRTE MAßNAHMEN

FREISTELLEN VON BRÜCKEN UND DURCHLÄSSEN (CA. 30 STÜCK)

DURCHGEFÜHRTE MAßNAHMEN

FREISTELLEN UND REINIGEN VON TREIBGUTFÄNGERN

DURCHGEFÜHRTE MAßNAHMEN

BEREINIGUNGEN GEWÄSSERRANDSTREIFEN & BEGEHUNGEN MIT VERANTWORTLICHEN

DURCHGEFÜHRTE MAßNAHMEN

BEREINIGUNGEN GEWÄSSERRANDSTREIFEN & BEGEHUNGEN MIT VERANTWORTLICHEN

DURCHGEFÜHRTE MAßNAHMEN

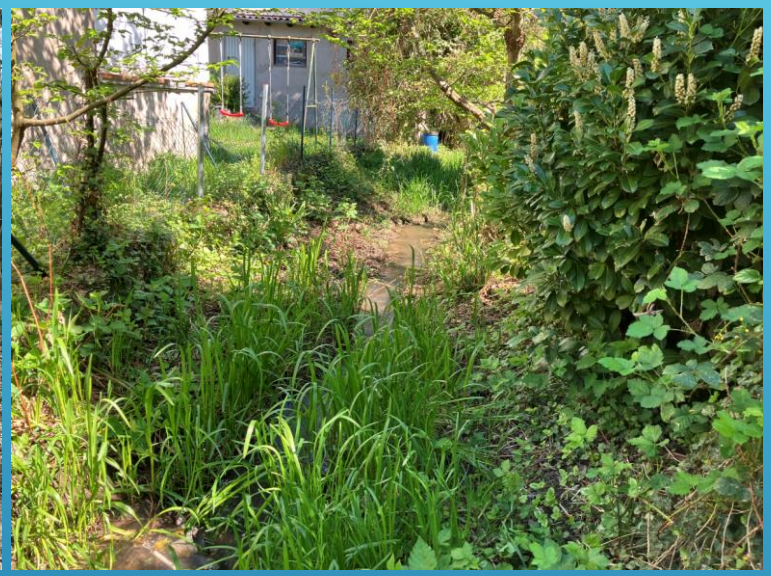

BEREINIGUNGEN GEWÄSSER (IN ABSTIMMUNG DER UNTEREN WASSERBEHÖRDE)

ANSTEHENDE MAßNAHMEN

BEREINIGUNGEN / GEFAHRENABWEHR / ABLÄUFE SICHERN

HOCHWASSER-/ STARKREGENSCHUTZMAßNAHMEN ANSTEHEND

- Beauftragte Maßnahmen Umsetzen
- Zusätzliche Versickerungsmulden Anlegen
- Schälen von Böschungen
- Einbau von diversen Querschlägen z.B. Bad Bodendorf, Koisdorf, Franken, Westum,..
- Herstellen und Überarbeiten div. Oberflächeneinläufe
- Schaffung zusätzlicher Ablaufrinnen und Sandfänge z.B. Franken, Bad Bodendorf, Sinzig
- Gewässerbearbeitung in Abstimmung untere Wasserbehörde durchführen
- Weiterführung Maßnahmen Hochwasservorsorgekonzept

VIDEO GEWÄSSER

Technische Hochwasser- und Starkregenvorsorge

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

andreas.polch@sinzig.de
